

Fundamentos do Gerenciamento de Projetos

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@edu.senai.br

Sumário

- Apresentação da Disciplina e Contextualização;
- Apresentação - Plano de Aulas e Ensino;
- Contexto da Disciplina;
- Sequência dos Conteúdos do Semestre;
- Metodologia de Ensino;
- Critérios de Avaliação;
- Atividade;
- Conclusão.

Definição de Projeto

Projeto é um esforço temporário realizado para criar um produto, serviço ou resultado único.

Exemplos Práticos

- Construção de uma casa
- Desenvolvimento de um aplicativo
- Organização de um evento
- Implantação de um sistema
- Criação de um site

Temporário

Possui início e fim bem definidos no tempo.

Único

Gera um produto, serviço ou resultado exclusivo.


Objetivo

Busca alcançar um resultado determinado.

Recursos

Envolve limitação de pessoas, dinheiro e tempo.


PMBOK - Project Management Body Of Knowledge

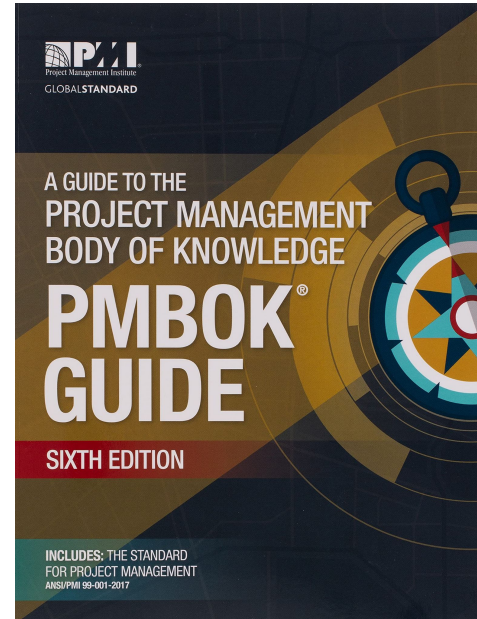

Divisão do PMBOK

- 47 processos;
- 10 Áreas do Conhecimento.

© 2006, Márcio d'Ávila

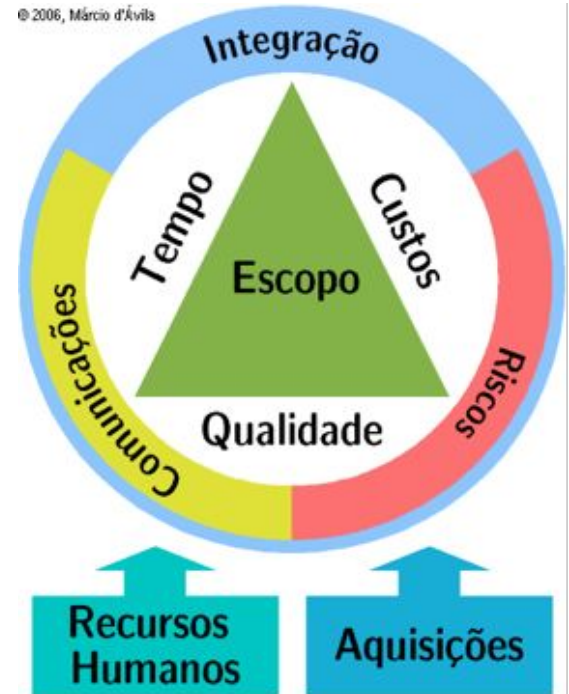

4. GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO

- 4.1 Desenvolver o termo de abertura do projeto;
- 4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto;
- 4.3 Orientar e gerenciar a execução do projeto;
- 4.4 Monitorar e controlar o trabalho do projeto;
- 4.5 Realizar o controle integrado de mudanças;
- 4.6 Encerrar o projeto ou fase;

8. GERENCIAMENTO DE QUALIDADE

- 8.1 Planejar o gerenciamento da qualidade;
- 8.2 Realizar a garantia da qualidade;
- 8.3 Controlar a qualidade;

12. GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES

- 12.1 Planejar o gerenciamento das aquisições;
- 12.2 Conduzir aquisições;
- 12.3 Controlar as aquisições;
- 12.4 Encerrar as aquisições;

5. GERENCIAMENTO DO ESCOPO

- 5.1 Planejar o Gerenciamento do Escopo;
- 5.2 Coletar os Requisitos;
- 5.3 Definir o escopo;
- 5.4 Criar a EAP;
- 5.5 Validar o escopo;
- 5.6 Controlar o escopo;

9. GERENCIAMENTO DA RECURSOS HUMANOS

- 9.1 Planejar o gerenciamento dos recursos humanos;
- 9.2 Mobilizar a equipe do projeto;
- 9.3 Desenvolver a equipe do projeto;
- 9.4 Gerenciar a equipe do projeto;

13. GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS

- 13.1 Identificar as Partes Interessadas;
- 13.2 Planejar o gerenciamento das Partes Interessadas;
- 13.3 Gestão do Engajamento das Partes Interessadas;
- 13.4 Controlar o Engajamento das Partes Interessadas;

6. GERENCIAMENTO DO TEMPO

- 6.1. Planejar o Gerenciamento do Cronograma;
- 6.2 Definir as atividades;
- 6.3 Sequenciar as atividades;
- 6.4 Estimar os recursos das atividades;
- 6.5 Estimar a durações das atividades;
- 6.6 Desenvolver o cronograma;
- 6.7 Controlar o cronograma;

10. GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES

- 10.1 Planejar o gerenciamento das comunicações;
- 10.2 Gerenciar as comunicações;
- 10.3 Controlar as comunicações;

7. GERENCIAMENTO DE CUSTOS

- 7.1 Planejar o gerenciamento dos custos;
- 7.2 Estimar os custos;
- 7.3 Determinar o orçamento;
- 7.4 Controlar os custos;

11. GERENCIAMENTO DE RISCOS

- 11.1 Planejar o gerenciamento dos riscos;
- 11.2 Identificar os riscos;
- 11.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos;
- 11.4 Realizar a análise quantitativa dos riscos;
- 11.5 Planejar as respostas aos riscos;
- 11.6 Controlar os riscos;

Estratégia Organizacional

- Uma escola tem o objetivo de aumentar em 10% o número de matrículas nos próximos 3 anos;
- Para isso, as estratégias de modernização e divulgação intensa na mídia foram escolhidas;
- Criação de programas que conterão projetos.

Estratégia Organizacional

- Programa 1 - Modernização da infraestrutura
 - Projeto 1 - Reforma de salas de aulas e banheiros;
 - Projeto 2 - Revitalização dos Laboratórios ;
 - Projeto 3 - Modernização da Biblioteca Central;
 - Projeto 4 - Criação de Biblioteca Virtual;
 - Projeto 5 - Criação de salas patrocinadas por empresas;
 - Projeto 6 - Melhoria de Comunicação Visual no campus.

Estratégia Organizacional

- Programa 2 - Modernização pedagógica
 - Projeto 1 - Criação de cursos a distância;
 - Projeto 2 - Adoção de novos materiais pedagógicos;
 - Projeto 3 - Formação continuada de professores;
 - Projeto 4 - Estímulo à criação científica junto ao corpo docente;
 - Projeto 5 - Criação de revistas eletrônicas.

Estratégia Organizacional



Estratégia Organizacional

- **Programa:** Grupo de projetos gerenciados de maneira coordenada;



- **Portfólio:** Coleção de projetos e programas que são agrupados para facilitar o efetivo gerenciamento.

Gerenciamento da Integração do Projeto

4. GERENCIAMENTO DE INTEGRAÇÃO

- 4.1 Desenvolver o termo de abertura do projeto;
- 4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto;
- 4.3 Orientar e gerenciar a execução do projeto;
- 4.4 Monitorar e controlar o trabalho do projeto;
- 4.5 Realizar o controle integrado de mudanças;
- 4.6 Encerrar o projeto ou fase;

Gerenciamento da Integração do Projeto

4.1 Desenvolver o termo de abertura do projeto — O processo de desenvolver um documento que formalmente autoriza a existência de um projeto e dá ao gerente do projeto a autoridade necessária para aplicar recursos organizacionais às atividades do projeto.

Gerenciamento da Integração do Projeto

4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto — O processo de definir, preparar e coordenar todos os planos subsidiários e integrá-los a um plano de gerenciamento de projeto abrangente. As linhas de base e os planos subsidiários integrados do projeto podem ser incluídos no plano de gerenciamento do projeto.

Gerenciamento da Integração do Projeto

4.3 Orientar e gerenciar o trabalho do projeto — O processo de liderar e realizar o trabalho definido no plano de gerenciamento do projeto e a implementação das mudanças aprovadas para atingir os objetivos do projeto.

Gerenciamento da Integração do Projeto

4.4 Monitorar e controlar o trabalho do projeto – O processo de acompanhar, revisar e registrar o progresso do projeto para atender aos objetivos de desempenho definidos no plano de gerenciamento do projeto.

Gerenciamento da Integração do Projeto

4.5 Realizar o controle integrado de mudanças — O processo de revisar todas as solicitações de mudança, aprovar as mudanças e gerenciar as mudanças nas entregas, ativos de processos organizacionais, documentos do projeto e no plano de gerenciamento do projeto, e comunicar a decisão sobre os mesmos.

Gerenciamento da Integração do Projeto

4.6 Encerrar o projeto ou fase — O processo de finalização de todas as atividades de todos os grupos de processos de gerenciamento do projeto para encerrar formalmente o projeto ou a fase.

Termo de Abertura do Projeto

- O Termo de Abertura do Projeto (TAP) é o documento que autoriza formalmente o início de um projeto e registra suas principais informações iniciais. Serve para:
 - Formalizar a existência do projeto.
 - Definir o objetivo e a justificativa.
 - Identificar o gerente do projeto.
 - Registrar as principais entregas e requisitos.
 - Apresentar premissas, restrições e riscos iniciais.
 - Identificar os principais stakeholders.
 - Estabelecer uma visão inicial de prazo e orçamento.

Atividade de Revisão

Link: <https://wayground.com/join>



Atividade

Elaborarem dois Termos de Abertura do Projeto (TAP): o primeiro deverá ser referente ao PII deste semestre, considerando a proposta, os objetivos e o contexto do novo projeto. O segundo, deve ser considerando o [Projeto FieldOps](#). Considerem toda a documentação e artefatos disponíveis para elaborar o documento.

Atividade

Os dois Termos de Abertura deverão apresentar as principais informações necessárias para formalizar e iniciar cada projeto, contemplando aspectos como objetivo, justificativa, principais entregas, requisitos iniciais, premissas, restrições, stakeholders, responsáveis e prazo estimado. Os documentos deverão ser organizados e entregues no repositório do GitHub.

Conclusão

- Apresentação inicial da disciplina;
- Entendimento dos Planos de Aulas e Ensino;
- Apresentação do Conteúdo Programático;
- Metodologia de Ensino;
- Critérios de Avaliação;
- Primeira Atividade.

Referências

1. CARVALHO, Fábio Câmara Araújo de. ****Gestão de projetos****. 2. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2018. E-book. Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br>>. Acesso em: 30 maio 2025.
2. SOUZA, Carla Patricia da Silva. ****Gestão de projetos****. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020. E-book. Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br>>. Acesso em: 30 maio 2025.
3. BUENO, Gislaine. ****Gestão de projetos para cibersecurity****. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020. E-book. Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br>>. Acesso em: 30 maio 2025.
4. BUNGART, José Wagner; POSSARLE, Roberto. ****Metodologia de projetos: conceitos, planejamento e desenvolvimento****. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2017.

Referências

5. CRUZ, Fábio. ****Scrum e Agile em projetos****. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2018. E-book (299 p.). Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160051>>. Acesso em: 20 jun. 2024.
6. CRUZ, Fábio. ****Scrum e PMBOK unidos no gerenciamento de projetos****. Rio de Janeiro: Brasport, 2013. E-book (416 p.). Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160061>>. Acesso em: 20 jun. 2024.
7. FINOCCHIO JÚNIOR, José. ****Project Model Canvas: gerenciamento de projetos sem burocracia****. Rio de Janeiro: Elsevier, c2013.
8. SUTHERLAND, Jeffrey Victor. ****Scrum: a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo****. 2. ed. rev. São Paulo: Leya, 2016.

Fundamentos do Gerenciamento de Projetos

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@edu.senai.br
