

Aquisições e Partes Interessadas

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@edu.senai.br

Sumário

1. Gerenciamento das Aquisições do Projeto
2. Exemplo de Gerenciamento das Aquisições
3. Atividade de Gerenciamento das Aquisições
4. Gerenciamento de Partes Interessadas
5. Exemplo de Partes Interessadas
6. Exemplo de Rede de Poder/Interesse
7. Atividade de Partes Interessadas

Gerenciamento de Riscos

12. GERENCIAMENTO DE AQUISIÇÕES

- 12.1 Planejar o gerenciamento das aquisições;
- 12.2 Conduzir aquisições;
- 12.3 Controlar as aquisições;
- 12.4 Encerrar as aquisições;

Gerenciamento das Aquisições do Projeto

12.1 Planejar o gerenciamento das aquisições – O processo de documentação das decisões de compras do projeto, especificando a abordagem e identificando fornecedores em potencial.

12.2 Conduzir as aquisições – O processo de obtenção de respostas de fornecedores, seleção de um fornecedor e adjudicação de um contrato.

Gerenciamento das Aquisições do Projeto

12.3 Controlar as aquisições — O processo de gerenciamento das relações de aquisições, monitoramento do desempenho do contrato e realizações de mudanças e correções nos contratos, conforme necessário.

12.4 Encerrar as aquisições — O processo de finalizar cada uma das aquisições do projeto.

Gerenciamento das Aquisições

- Detalhar as características que a solução a ser contratada deverá ter;
- Preparar uma estimativa para determinar o orçamento;
- Divulgar a oportunidade de contratação;
- Identificar a lista de vendedores qualificados;
- Receber e avaliar propostas.

Condução das Aquisições

- Preços e condições de pagamento;
- Critérios de inspeção, qualidade e aceitação;
- Garantia e suporte futuro ao produto;
- Incentivos e penalidades;
- Seguros e obrigações de realização;
- Cláusula de rescisão.

Controle das Aquisições

Uma vez que você já tenha definido as características da solução que precisa ser entregue e contratado os fornecedores, o seu próximo passo é controlar o desempenho de cada um dos fornecedores com relação ao que foi estabelecido no contrato.

Exemplo de Gerenciamento das Aquisições

ID	Cód. WBS/E AP	Item a ser adquirido	Urgência	Motivo da Decisão de Compra	Fornecedores potenciais	Qtde	Custo unitário	Custo total	Previsão entrega	Observações
1	5	Servidor com processador de 2 Ghz, 8 GB de RAM e 500 GB	5-Muito Alta	É necessário para o funcionamento do sistema.		1,000	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		
2	5	Workstation com processador de 1,5 Ghz, 4 GB de RAM e	5-Muito Alta	É necessário para a utilização do sistema.		1,000	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00		
3	5	Licença do Windows Server	4-Alta	É necessário para o uso do servidor.	Microsoft	1,000	R\$ 800,00	R\$ 800,00		
4	5	Licença do Windows 7	2-Baixa	Sistema para fazer a Workstation funcionar.	Microsoft	1,000	R\$ 350,00	R\$ 350,00		
5	5	Licença do Microsoft Office	2-Baixa	Necessário para trabalhar com documentos.	Microsoft	1,000	R\$ 350,00	R\$ 350,00		
6	5	Confecção de Apostila	4-Alta	Para o auxílio dos usuarios.		10,000	R\$ 30,00	R\$ 300,00		
								R\$ 6.300,00		

Atividade

Elaborem uma tabela do Gerenciamento das Aquisições do [Projeto FieldOps](#), considerando toda a documentação e os artefatos disponíveis. O plano deverá apresentar item, urgência, motivo, fornecedores, quantidade, custo unitário, custo total entre outros campos necessários. O documento deverá ser organizado e entregue no repositório do GitHub.

Gerenciamento de Partes Interessadas

13. GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS

- 13.1 Identificar as Partes Interessadas;
- 13.2 Planejar o gerenciamento das Partes Interessadas;
- 13.3 Gestão do Engajamento das Partes Interessadas;
- 13.4 Controlar o Engajamento das Partes Interessadas;

Gerenciamento das Partes Interessadas

13.1 Identificar as partes interessadas — O processo de identificar pessoas, grupos ou organizações que podem impactar ou serem impactados por uma decisão, atividade ou resultado do projeto e analisar e documentar informações relevantes relativas aos seus interesses, nível de engajamento, interdependências, influência, e seu impacto potencial no êxito do projeto.

Gerenciamento das Partes Interessadas

13.2 Planejar o gerenciamento das partes interessadas — O processo de desenvolver estratégias apropriadas de gerenciamento para engajar as partes interessadas de maneira eficaz no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto, com base na análise das suas necessidades, interesses, e impacto potencial no sucesso do projeto.

Gerenciamento das Partes Interessadas

13.3 Gerenciar o engajamento das partes interessadas — O processo de se comunicar e trabalhar com as partes interessadas para atender às suas necessidades/expectativas delas, abordar as questões à medida que elas ocorrem, e incentivar o engajamento apropriado das partes interessadas nas atividades do projeto, no decorrer de todo o ciclo de vida do projeto.

Gerenciamento das Partes Interessadas

13.4 Controlar o engajamento das partes interessadas – O processo de monitorar os relacionamentos das partes interessadas do projeto em geral, e ajustar as estratégias e planos para o engajamento das partes interessadas.


Exemplo de Partes Interessadas

- Clientes
- Usuários;
- Patrocinador;
- Equipe do projeto;
- Gerente de projetos;
- Governo;
- Órgãos regulamentadores;
- Investidores;
- Fornecedores;
- Colaboradores;
- Sindicatos;
- Comunidade;

Técnicas Analíticas das Partes Interessadas

- Desinformado: Sem conhecimento do projeto e impactos potenciais.
- Resistente: Ciente do projeto e dos impactos potenciais e resistente à mudança.
- Neutro: Ciente do projeto e mesmo assim não dá apoio ou resiste.
- Dá apoio: Ciente do projeto e dos impactos potenciais e dá apoio à mudança.
- Lidera: Ciente do projeto e dos impactos potenciais e ativamente engajado em garantir o êxito do projeto.

Exemplo de Rede de Poder/Interesse

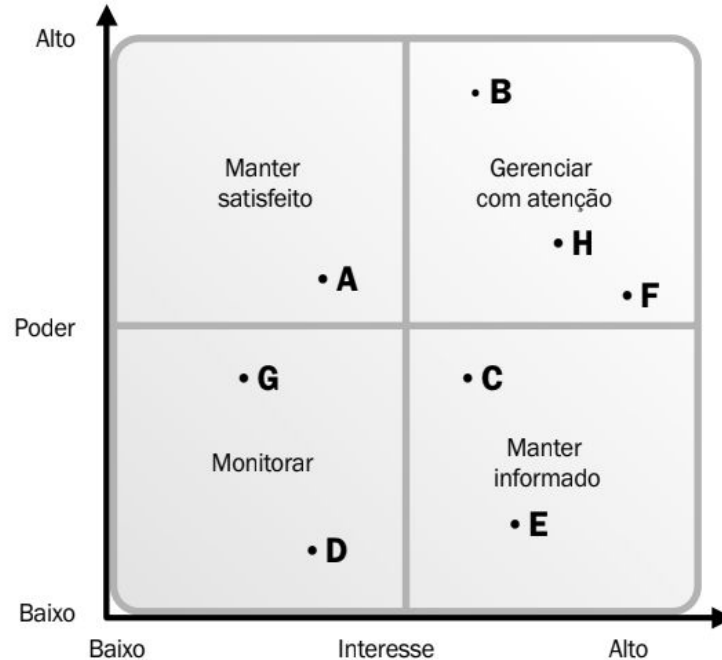

Atividade

Elaborem uma matriz de Rede de Poder/Interesse do Projeto FieldOps, considerando toda a documentação e os artefatos disponíveis. A matriz deverá considerar as partes interessadas do projetos e classificar em: Monitorar; manter informado; manter satisfeito; e gerenciar com atenção. O documento deverá ser organizado e entregue no repositório do GitHub.

Referências

1. CARVALHO, Fábio Câmara Araújo de. ****Gestão de projetos****. 2. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2018. E-book. Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br>>. Acesso em: 30 maio 2025.
2. SOUZA, Carla Patricia da Silva. ****Gestão de projetos****. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020. E-book. Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br>>. Acesso em: 30 maio 2025.
3. BUENO, Gislaine. ****Gestão de projetos para cibersecurity****. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020. E-book. Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br>>. Acesso em: 30 maio 2025.
4. BUNGART, José Wagner; POSSARLE, Roberto. ****Metodologia de projetos: conceitos, planejamento e desenvolvimento****. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2017.

Referências

5. CRUZ, Fábio. ****Scrum e Agile em projetos****. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2018. E-book (299 p.). Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160051>>. Acesso em: 20 jun. 2024.
6. CRUZ, Fábio. ****Scrum e PMBOK unidos no gerenciamento de projetos****. Rio de Janeiro: Brasport, 2013. E-book (416 p.). Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160061>>. Acesso em: 20 jun. 2024.
7. FINOCCHIO JÚNIOR, José. ****Project Model Canvas: gerenciamento de projetos sem burocracia****. Rio de Janeiro: Elsevier, c2013.
8. SUTHERLAND, Jeffrey Victor. ****Scrum: a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo****. 2. ed. rev. São Paulo: Leya, 2016.

Aquisições e Partes Interessadas

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@edu.senai.br
