

Processos e Áreas de Conhecimento

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@edu.senai.br

Sumário

1. O que é um processo?
2. Processos × Áreas de Conhecimento;
3. Gerenciamento do Escopo do Projeto;
4. Classificação de requisitos;
5. Estrutura Analítica do Projeto (EAP)
6. Atividade;
7. Conclusão.


O que é um processo?

- Um processo é um conjunto de atividades realizadas para transformar ENTRADAS em RESULTADOS.
- Exemplo: Solicitação do cliente → Análise e desenvolvimento → Funcionalidade entregue
- Em gerenciamento de projetos, os processos ajudam a organizar, executar e controlar o trabalho.
- Pergunta: O que pode acontecer com um projeto quando não existem processos bem definidos?

Grupos de Processos

Os processos de gerenciamento podem ser organizados em cinco grandes grupos:

- **INICIAÇÃO** - Autorizar e definir o projeto
- **PLANEJAMENTO** - Definir como o projeto será realizado
- **EXECUÇÃO** - Realizar o trabalho planejado
- **MONITORAMENTO E CONTROLE** - Acompanhar resultados e corrigir desvios
- **ENCERRAMENTO** - Finalizar e formalizar o projeto

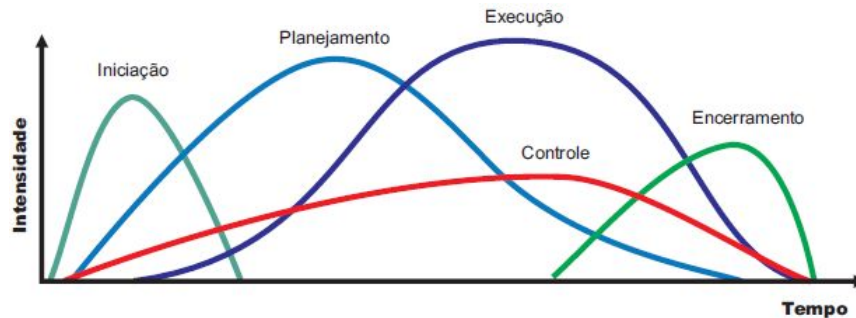

Processos × Áreas de Conhecimento

GRUPOS DE PROCESSOS

Mostram quando e com qual finalidade o gerenciamento acontece.

ÁREAS DE CONHECIMENTO

Mostram o que precisa ser gerenciado.

EXEMPLO: APLICATIVO DE DELIVERY

01 INICIAÇÃO

objetivo e
stakeholders

>

02 PLANEJAMENTO

escopo, prazo,
custos e riscos

>

03 EXECUÇÃO

desenvolvimento

>

04 MONITORAMENTO

prazo, custos e
qualidade

>

05 ENCERRAMENTO

entrega e lições
aprendidas

Gerenciamento do Escopo do Projeto

5. GERENCIAMENTO DO ESCOPO

- 5.1 Planejar o Gerenciamento do Escopo;
- 5.2 Coletar os Requisitos;
- 5.3 Definir o escopo;
- 5.4 Criar a EAP;
- 5.5 Validar o escopo;
- 5.6 Controlar o escopo;

Gerenciamento do Escopo do Projeto

5.1 Planejar o gerenciamento do escopo — O processo de criar um plano de gerenciamento do escopo do projeto que documenta como tal escopo será definido, validado e controlado.

Gerenciamento do Escopo do Projeto

5.2 Coletar os requisitos — O processo de determinar, documentar e gerenciar as necessidades e requisitos das partes interessadas a fim de atender aos objetivos do projeto.

Gerenciamento do Escopo do Projeto

5.3 Definir o escopo — O processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do produto.

5.4 Criar a EAP — O processo de subdivisão das entregas e do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciáveis.

Gerenciamento do Escopo do Projeto

5.5 Validar o escopo — O processo de formalização da aceitação das entregas concluídas do projeto.

5.6 Controlar o escopo — O processo de monitoramento do andamento do escopo do projeto e do produto e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do escopo.

O que são Requisitos?

Na Gestão de Projetos, entende-se requisito como parte ou condição necessária para que o projeto possa ser realizado e obtenha sucesso. Os requisitos podem ser agrupados em classificações que permitam um refinamento e detalhamento posteriores à medida que os mesmos são elaborados. Estas classificações incluem:

Classificações dos Requisitos

1. Necessidades de negócios, que descrevem as necessidades de nível mais alto da organização como um todo, tais como as questões ou oportunidades de negócios e as razões porque um projeto foi empreendido.

Classificações dos Requisitos

2. Requisitos das partes interessadas, que descrevem as necessidades de uma parte interessada ou de um grupo de partes interessadas.

3. Requisitos de solução, que descrevem os atributos, funções e características do produto, serviço ou resultado que atenderão aos requisitos do negócio e dos interessados.

Classificações dos Requisitos

4. Os requisitos de transição descrevem as capacidades temporárias, tais como os requisitos de conversão de dados e de treinamento necessários à transição do estado atual de “como está” ao estado futuro de “como será”.

Classificações dos Requisitos

5. Os requisitos de projeto, descrevem as ações, processos, ou outras condições que devem ser cumpridas pelo projeto.
6. Os requisitos de qualidade, que capturam quaisquer condições ou critérios necessários para validar a conclusão bem sucedida de uma entrega de projeto ou o cumprimento de outros requisitos do projeto.

Como Coletar Requisitos

- Entrevistas;
- Grupos de discussão;
- Brainstorming;
- Mapas mentais;
- Questionários e pesquisas;
- Observações;
- Benchmarking.

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

EAP é a decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser executado pela equipe do projeto a fim de alcançar os objetivos do projeto e criar as entregas exigidas. Cada nível descendente da EAP representa uma definição cada vez mais detalhada do trabalho do projeto.

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

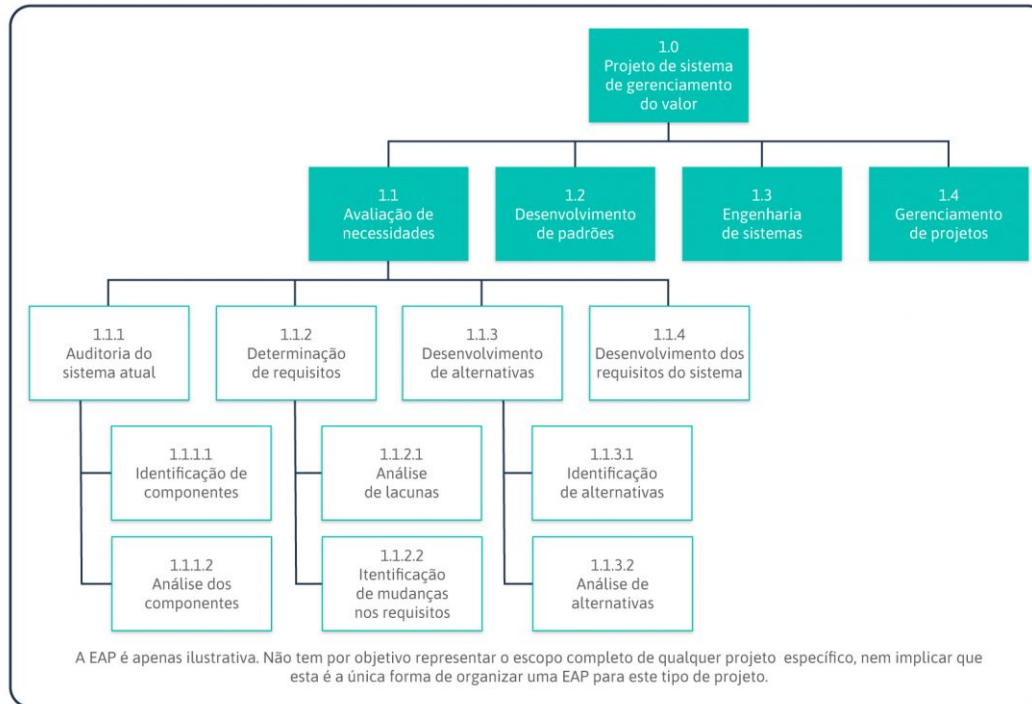


Figura 5-12. Amostra de EAP Decomposta até o Nível de Pacotes de Trabalho

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

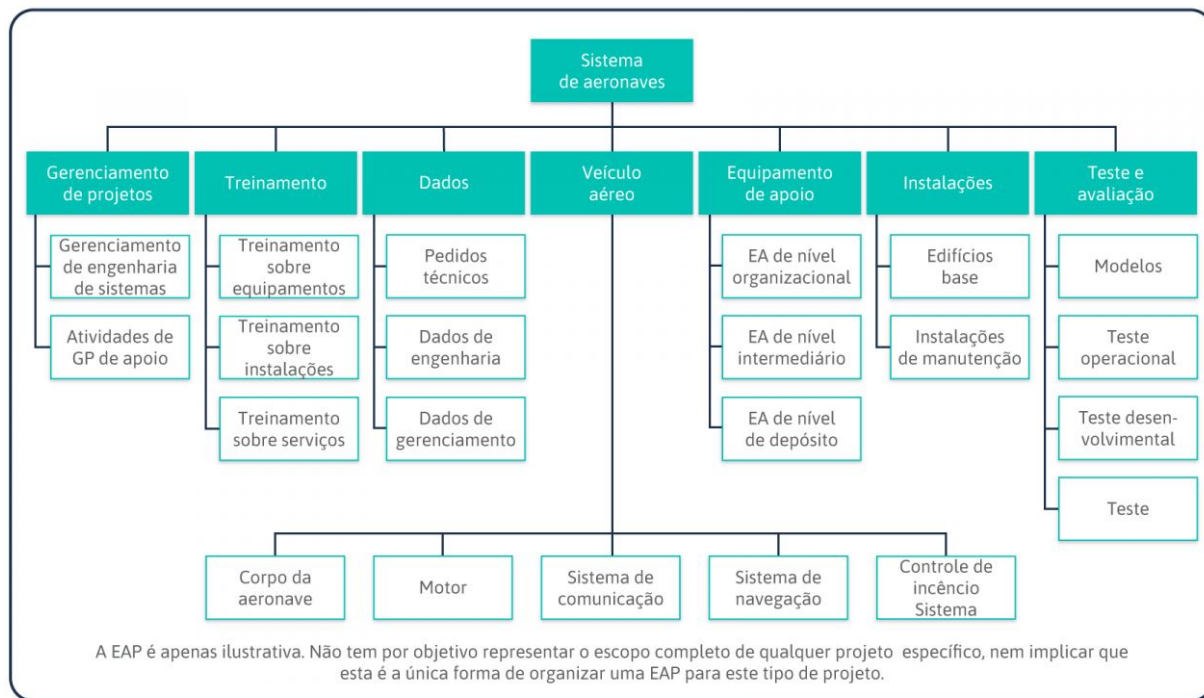


Figura 5-14. Exemplo de EAP com Entregas Principais

Atividade

Elaborarem a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) do [Projeto FieldOps](#). Considerem toda a documentação e artefatos disponíveis para elaborar o documento. O diagrama deverá apresentar as principais informações da estrutura do projeto e seus requisitos. O documento deverá ser organizado e entregue no repositório do GitHub.

Conclusão

- O que é um processo?
- Processos × Áreas de Conhecimento;
- Gerenciamento do Escopo do Projeto;
- Classificação de requisitos;
- Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

Referências

1. CARVALHO, Fábio Câmara Araújo de. ****Gestão de projetos****. 2. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2018. E-book. Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br>>. Acesso em: 30 maio 2025.
2. SOUZA, Carla Patricia da Silva. ****Gestão de projetos****. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020. E-book. Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br>>. Acesso em: 30 maio 2025.
3. BUENO, Gislaine. ****Gestão de projetos para cibersecurity****. 1. ed. São Paulo: Contentus, 2020. E-book. Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br>>. Acesso em: 30 maio 2025.
4. BUNGART, José Wagner; POSSARLE, Roberto. ****Metodologia de projetos: conceitos, planejamento e desenvolvimento****. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2017.

Referências

5. CRUZ, Fábio. ****Scrum e Agile em projetos****. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2018. E-book (299 p.). Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160051>>. Acesso em: 20 jun. 2024.
6. CRUZ, Fábio. ****Scrum e PMBOK unidos no gerenciamento de projetos****. Rio de Janeiro: Brasport, 2013. E-book (416 p.). Disponível em: <<https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/160061>>. Acesso em: 20 jun. 2024.
7. FINOCCHIO JÚNIOR, José. ****Project Model Canvas: gerenciamento de projetos sem burocracia****. Rio de Janeiro: Elsevier, c2013.
8. SUTHERLAND, Jeffrey Victor. ****Scrum: a arte de fazer o dobro do trabalho na metade do tempo****. 2. ed. rev. São Paulo: Leya, 2016.

Processos e Áreas de Conhecimento

Prof. Me. Deivison S. Takatu

deivison.takatu@edu.senai.br
